

INFORME EJECUTIVO

Fecha: 10 de abril del 2023

Plantaciones Agrícolas y Forestales:

Hemos establecido **28,578,362 millones** de plantas agrícolas y forestales equivalentes a **243,810.16 tareas (ta)**, de las cuales **152,836 ta (23,656,586 plantas)**, corresponden al componente agrícola y **90,974 ta (4,747,614 plantas)** al componente forestal, todo esto en beneficio de **9,788 personas**.

Adicionalmente, se han establecido en los proyectos agroforestales, **13,512** nuez moscada, **18,395** malagueta, **109** clavo dulce y **6** plantas de canela.

RUBRO	CANT. PLANTAS	TAREAS
CAFÉ	23,071,804	88,149
AGUACATE	973,392	64,893
CACAO	2,950	63
MANGO	2,150	126
FORESTAL	4,832,829	91,316
TOTAL	28,883,126	244,547

En este primer trimestre del año 2023, (enero-marzo), producto de la sequía que ha transcurrido en los últimos meses, los PDAs no han realizado labores de siembra. No obstante, se han realizado 721 visitas a parcelas para fines de brindar asistencia técnica; y en adición, se han entregado insumos agrícolas a 131 productores.

SIEMBRA 2023

RUBRO	1ER TRIMESTRE
CAFÉ	0
AGUACATE	0
TOTAL TRIMESTRAL	0



Estas intervenciones se han realizado en el marco de las zonas de trabajo de los proyectos agroforestales, a saber: **Hondo Valle y Juan Santiago**: Provincia Elías Piña; **Sabaneta**: Provincia San Juan; **Las Cañitas**: Provincia de Azua; **Independencia**: Provincia Independencia; **Bahoruco**: Provincia Bahoruco; **Los Fríos**: Provincias Azua y San Juan; **Barahona**: Provincia Barahona; otras. En beneficio de importantes cuencas hidrográficas, como son: Río Artibonito, Río Yaque del Sur, Lago Enriquillo, Nizaito, Cuenca alta del río Yuna, río Yásica, Boba, Río Yaque del Norte, entre otros.

VISTA AÉREA

ZONAS INTERVENIDAS EN EL PDA SABANETA



ANTES



DESPUES

Agroinsumos Entregados/Asistencia Técnica



Se han suministrado un total de **83,200 quintales** de fertilizantes químicos, **6,916 Litros** abono Foliar, **12,274 Litros** de Insecticida y litros de fungicida a los fines de dar mantenimiento y asistencia a las plantaciones establecidas en beneficio de más de **15,000 productores**.

En este 1er. trimestre, hemos distribuido 200 quintales de fertilizante, 444 litros de abono foliar, 30 litros de insecticida y 10 litros de fungicida.

Más empleo a través de Brigadas:

Los PDAs, han fomentado la economía local, generando empleo a más de **1,321 personas (agrícolas y forestales)**, a través de la conformación en todas las zonas de trabajo de brigadas agrícolas y forestales, con una inversión promedio mensual de **RD\$10 MM**.

Incentivo Financiero para los Productores

Desde el mes de julio del 2022 se reactivó el pago del incentivo financiero de **RD\$5,000 pesos mensuales** a los pequeños productores, por concepto de transformación del modelo de producción, por uno ambientalmente sostenible. Esto para incluir a nuevos productores y/o los que aún no tienen parcelas en producción y tienen menos de 3 años en el proyecto. A marzo 2023, unos **6,245 productores** han recibido el incentivo financiero.

Componente Titulación



Con relación a la titulación de las parcelas en el proyecto **Juan Santiago**, entregamos los certificados de títulos de propiedad a **915 beneficiarios** para igual número de parcelas.

En **Hondo Valle** se espera el fallo para la entrega de **993 títulos** en Junio 2023. En **Sabaneta** están sometidos **567 expedientes** para aprobación legal. En **Bahoruco** se levantaron **1,666 parcelas**, a espera de aprobación legal. En **Independencia** se levantaron **1,485 parcelas**, a espera de aprobación legal; En **Barahona** se han realizado unos **1,244** levantamientos catastrales, a espera de aprobación técnica en mensura, y en **Los Fríos** y **las Cañitas** se dará inicio a los trabajos de medición a partir abril-mayo 2023.

Rehabilitación de Caminos Vecinales e Interparcelarios

* **CAMINOS VECINALES.** Actualmente, se encuentra en ejecución la rehabilitación de **232.27 kilómetros** de Caminos Vecinales, en los proyectos de Las Cañitas, Bahoruco, Barahona, Hondo Valle, Independencia, Los Fríos y Sabaneta, con la coordinación técnica y administrativa del MOPC, a través de la **UEPFRE**, con un avance promedio de **83%** equivalentes a unos **232.27 kilómetros ejecutados.** **En este trimestre se ha supervisado el avance de 42.45 km.**

CAMINOS INTERPARCELARIOS. Desde el pasado agosto 2020, se ejecutan los trabajos para la rehabilitación de **261.40 km Caminos Interparcelarios** en los siguiente proyectos:

Independencia Lote I: 36.6 km contratados, terminados 19.38 km (52.95%) y 12.20 en ejecución (33.33%) para un avance de **86.28%**.

Bahoruco Lote II: 39.40 km contratados para un avance de **99.51% ejecutados.**

Barahona Lote III - Ciénaga: 27.9 Km Contratados, se han terminado 15.16 km (54.34%) y en ejecución 8.25 km para un (29.57%) Para un avance de **83.91%**.

Barahona Lote IV - Polo: 57 Km Contratados. Se han terminado unos 57.38 km, para un avance de **(100.67%)**

Barahona Lote V – Santa Elena: 48 Km Contratados, se han terminado unos 20.48 km para un avance de (42.67%) y 19.50 en ejecución, limpieza, corte, relleno, para un avance (40.63%) **Para un 83.29%.**

Barahona Lote VI – Polo 52.50 km de caminos interparcelarios: se avanza en los levantamientos topográficos, para posterior inicio de labores de ejecución.

* **EQUIPOS AMARILLOS:** Con los equipos amarillos de la UTEPDA, hemos acondicionado **908.64 km de caminos vecinales e interparcelarios**, entre los cuales están: Camino Los Fríos – El Montazo (Los Fríos), Neiba - Rancho Viejo (Bahoruco), Cañada Miguel – Aniceto Martínez (Hondo Valle), Barreras (Independencia), Los Ballesteros al Firme (Sabaneta), La Caya Polo-La Malanga (Barahona) y Tetero Constanza (Las Cañitas).

De los cuales en este año del 2023, se han intervenido 270.61 km.



Rehabilitación de Sistema de Riego

Durante esta gestión se reanudaron los trabajos para la terminación de la construcción y reparación de los Sistemas de Riego en las comunidades de **Los Pinos del Edén y Boca de Cachón**, provincia Independencia, a través de la cual se contempla el regío en un área de 1,500 y 300 tareas respectivamente. Estas instalaciones fueron entregadas a **INDESUR** para manejo y producción.



Componente Apícola

En cuanto al fomento de la producción apícola, hemos extraído unos **2,300 galones** de miel. Y en este primer trimestre del año 2023 se ha extraído **606 galones** de miel, se han distribuidos a los distintos proyectos los siguientes insumos:

- 400 cajas de colmenas doble con pie de cría
- 200 cajas de abejas vacías
- 39 overoles completos
- 13 velos
- 5 extractores de acero inoxidable
- 20 sacos de azúcar
- 65 pares de guantes
- 46 espátulas
- 44 cuchillos despeculadores
- 45 humadores
- Entre otros insumos.





Capacitaciones

Actualmente, se han desarrollado **309 eventos** de capacitación y beneficiado a **8,301 personas** (productores y técnicos), en temas como: Manchado en el aguacate, Manejo de Quejas y Reclamos, Conservación y repoblación de los Recursos Naturales, Sistema y Fincas Agroforestal, entre otros. **De los cuales para este primer trimestre del 2023 se han capacitado a 848 personas en 32 eventos desarrollados.**



Sistematización de Monitoreo y Gestión SDIGEM

Esta gestión se enfocó en la digitalización de todas las acciones administrativas y operativas que se ejecutan, a través de la puesta en operación del Sistema de Monitoreo y Gestión SDIGEM. Esto ha permitido avanzar en la georreferenciación y registro de unas **27,000 parcelas** establecidas, logrando a la fecha, la sistematización del **88%** de las plantas sembradas, para un total de **60,186,000 plantas** en los diferentes rubros, así como también, el registro y control efectivo de las entregas de plantas y agroinsumos en los proyectos. **Para este primer trimestre hemos registrado unas 8,800,713 plantas.**

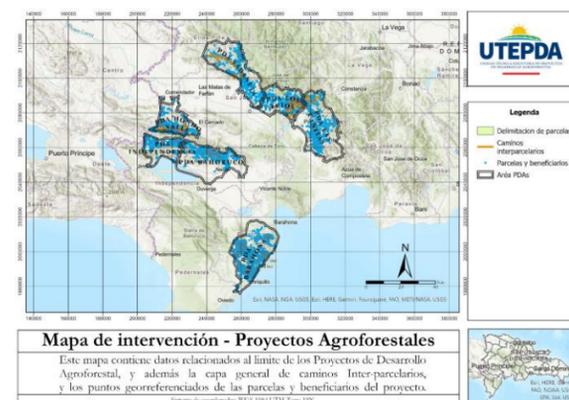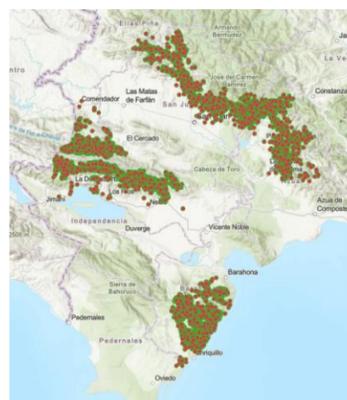

INVERSION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA 2023

Verificación de Resultados del Programa Contrato de Préstamo BID 4553-OC/DR

En esta gestión, hemos generado cinco desembolsos por resultados, basado en el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a favor del Estado Dominicano. Con una ejecución presupuestaria de **RD\$3, 3,847,165,594.56¹** logramos alcanzar un reembolso por resultados alcanzados de **US\$43.6 MM** (equivalentes a unos **RD\$ 2,400,192,660.66**), gestionados durante 2 año y 8 meses de gestión, a favor del Estado Dominicano. En total, el PDA ha generado un desembolso contra resultado de unos **US\$47,96MM** (equivalentes a unos **RD\$2,685.95MM** de pesos).

En octubre del 2022 realizamos la 6ta auditoria técnica obteniendo un desembolso de resultado de US\$8 millones, para un total de US\$18.80 millones solo en 2022.

Ejecución presupuestaria Agosto 2020 – Marzo 2023

Desde el 24 de agosto del 2020 a la fecha se han invertido **RD\$ 4,205,327,577.67**. Para el trimestre enero – marzo 2023, se apropió una cuota de **RD\$292 millones de pesos** del presupuesto aprobado, de los cuales invertimos **RD\$ RD\$290,958,318.79 millones de pesos**, para un avance de ejecución de un **99.64%**.

A continuación, mostramos en detalle la inversión 2023 por proyectos.

Total de inversión aprobados por proyecto (2023)				
Proyectos	2023	Total	Presupuesto 2023	% Avance
	Inversión 1er Trimestre			
Administración, Auditoría y Evaluación	6,512,975.75	6,512,975.75	52,988,643.00	12%
Hondo Valle	38,936,372.85	38,936,372.85	199,468,083.00	20%
Sabaneta	31,561,367.09	31,561,367.09	164,625,599.00	19%
Barahona	45,220,425.42	45,220,425.42	319,677,636.00	14%
Bahoruco	68,569,444.55	68,569,444.55	270,826,849.00	25%
Los Frios	32,458,459.54	32,458,459.54	184,072,321.00	18%
Las Cañitas	31,756,581.94	31,756,581.94	169,254,217.00	19%
Independencia	35,942,691.65	35,942,691.65	192,075,295.00	19%
Total inversión	290,958,318.79	290,958,318.79	1,552,988,643.00	19%

Seguimiento y gestión al primer trimestre

En detalle, presentamos las partidas donde se ha invertido el presupuesto del primer trimestre:

2.1 Remuneraciones y contribuciones: la cual corresponde a pagos de nóminas de 1,007 jornaleros agrícolas, 314 brigadistas forestales, 6,400 beneficios (propietarios de terrenos) y las nóminas del personal del proyecto, responsable de la coordinación técnica, operativa y administrativa de la UTEPDA;

2.2 Contrataciones de Servicios: corresponde a la carga fija de servicios, como son: teléfonos, internet, electricidad, publicidad, viáticos, alquileres, mantenimiento, auditorias, capacitación, entre otros;

2.3 Materiales y Suministro: corresponde al pago de los alimentos crudos que requieren las brigadas en el ejercicio de sus funciones, agroquímicos para el mantenimiento de las plantas, neumáticos, herramientas, combustibles, material de limpieza, material de oficina, repuestos, entre otros, mediante los cuales contribuyen a la operatividad de los proyectos.

2.6 Bienes, muebles e Inmuebles intangibles: contribuye al establecimiento de plantas de café y aguacate que se tiene previsto en la meta del 2023, así como también equipos de tecnología que van a fortalecer al Sistema de Información Geográfica.

2.7 Obras: Contribuye a la rehabilitación y construcción de caminos interparcelarios, así como el acondicionamiento de estos; en adición a la construcción de infraestructuras en sistemas de riego.

A continuación, mostramos el cuadro de seguimiento y gestión de la inversión al 31 de marzo del 2023, los cuales contienen montos aprobados y montos en tránsito para su aprobación:

Seguimiento y gestión al 31 de Marzo del 2023	
PARTIDAS	Inversión
2.1 Remuneraciones y contribuciones	152,753,240.65
2.2 Servicios	17,190,913.85
2.3 Materiales y suministro	87,420,303.53
2.6 Bienes muebles e inmuebles intangibles	4,736,800.00
2.7 Obras	28,857,060.76
TOTAL INVERSION	290,958,318.79

Compras y Contrataciones

En cumplimiento a la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, en este trimestre, fueron realizados 30 procesos de diferentes modalidades, con un monto estipulado para los mismos de más de **RD\$17,599,634.72** en diferentes modalidades, los cuales contribuyen a la meta establecida en la estrategia de ejecución.

¹Esta ejecución presupuestaria corresponde al monto de las partidas que son reembolsables por el contrato del BID.
